

San Sebastián Tlacotepec; Pue 06 de marzo de 2023


OFICIO No. SRFT-004

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**  
**SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. RAYMUNDO ATANACIO ARCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA  
2021-2024



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejercicio	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
San Sebastián Tlaxtepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	349244.35	32313	0	Total del Programa Presupuestario	22698915.66	61363354.38	61363354.38	61363354.38	61363354.38	61363354.38	61363354.38				61076585.59	N/A	61076585.59	
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	13684719.23	26452561.42	26452561.42	26452561.42	26452561.42	26452561.42	26452561.42	26452561.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	1214368.02	1214368.02	1214368.02	1214368.02	1214368.02	1214368.02	1214368.02	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	LEBORACIÓN DE PROYECTOS
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9014196.43	10812050.35	10812050.35	10812050.35	10812050.35	10812050.35	10812050.35	10812050.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
San Sebastián Tlaxtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACION PARA ES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxtepec			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0	16545264.22	16545264.22	16545264.22	16545264.22	16545264.22	16545264.22	16545264.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN HABITACIONAL



ID	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	FE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECURS	MO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	PROG_FONDOS	CONV	INSTITUCION	EFECTIVO	REINTEGRO	GASTO	ID_PARTIDA	DESC_PARTIDA	GENERICA	ENERGICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	TIPO	COMPROBADO	DEVEDADO	EFECTUADO	PAGADO	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS							
10	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	33213		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional			0	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98	5668559.98							(obs.) observación PEC HAZADA NO CORRESPONDE A LOS INTERESES ACUMULADOS, albertocarrera NO CORRESPONDE MONTO APROBADO, MI DEL MINISTRADO AL	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado		
11	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable			0	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39	670550.39							REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado		
12	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación			1.37E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07	2.65E+07						CONSTRUCCIÓN DE CASERÍAS, SIN OBSERVACIONES albertocarrera	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado	
13	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec			Gasto corriente	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			0	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02	1214986.02						LEBORACIÓN DE PROYECTOS	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado
14	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec			Gasto de Inversión	611	Edificación habitacional			0	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07	1.65E+07						EDIFICACIÓN HABITACIONAL	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado
15	2022	4	21	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	2022	33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	FAIS Municipal	FAIS Municipal	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			9014196.4	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07	1.08E+07						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	albertocarrera	15/01/2023 13:42	Validado	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Programa	Programa Fondo Convenio o Especifico	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyecto	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005 Sin Especificar	Sin Especificar	41837.92	6668	Total del Programa Presupuestario	2778793.66	9899943.72	9899943.72	9899943.72	9899943.72	9899943.72	9778631.72	9778631.72	N/A	N/A	9870221.95					
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	1056669.95	1056669.95	1056669.95	1056669.95	1056669.95	1056669.95	1056669.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	119590.2	119590.2	119590.2	119590.2	119590.2	119590.2	119590.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	UNIFORMES	
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	3683830.63	3683830.63	3683830.63	3683830.63	3683830.63	3683830.63	3683830.63	3683830.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	688924	688924	688924	688924	688924	688924	688924	688924	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	217384	217384	217384	217384	217384	217384	217384	217384	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	493238.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACIÓN AL CERESO DE TEHUACÁN
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0	11886	11886	11886	11886	11886	11886	11886	11886	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			2 - Gasto de Inversión	551 - Equipo de defensa y seguridad	0	285398.06	285398.06	285398.06	285398.06	285398.06	285398.06	285398.06	285398.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ARMAMENTO Y MUNICIONES
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		0	74600	74600	74600	74600	74600	38815	38815	38815	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	GRATIFICACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		0	539346.73	539346.73	539346.73	539346.73	539346.73	539346.73	539346.73	539346.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF MUNICIPAL
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			619 - Trabajos de adquisición en edificaciones y otros trabajos especializados		34455.471	1626527.5	1626527.5	1626527.5	1626527.5	1626527.5	1626527.5	1626527.5	1626527.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	314900	314900	314900	314900	314900	314900	314900	314900	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA
Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN 1005	Municipio de San Sebastián Tlaxiaco			311 - Energía eléctrica		840000	787648	787648	787648	787648	787648	702121	702121	702121	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA














FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
PUE2204021 80964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		670550.39	670550.39
PUE2204021 68854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		391800.44	391800.44
PUE2204021 76682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1335743.11	1335743.11
PUE2204021 76597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1895183.22	1895183.22
PUE2204021 76616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1695618.92	1695618.92

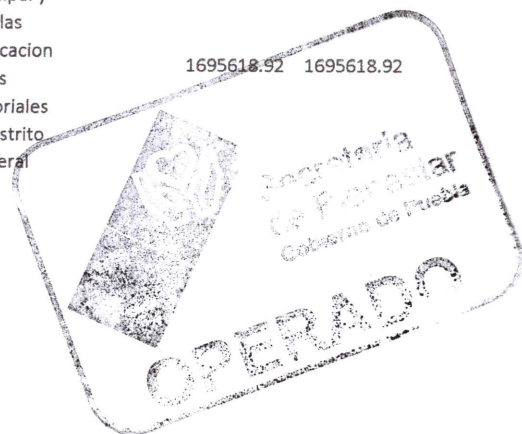

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
PUE2204021 74874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2670124.81	2670124.81
PUE2204021 77557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN		300000	300000
PUE2204021 77557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3992139.48	3992139.48
PUE2204021 77517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN		500000	500000
PUE2204021 77517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1676420.5	1676420.5



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
PUE220402180964	Metros lineales	1839.2	1839.2
PUE220402168854	Piezas	10	10
PUE220402176682	Metros Cuadrados	6600	6600
PUE220402176597	Metros Cuadrados	20040	20040
PUE220402176616	Metros Cuadrados	18600	18600
PUE220402174874	Metros Cuadrados	18280	18280
PUE220402177557	Metros Cuadrados	840	840
PUE220402177517	Metros Cuadrados	576	576




FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
PUE22040218096 4	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Río	CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO VILLA DEL RIO, 75944 VILLA DEL RÍO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A NARANJASTITLAN DE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL	-96.77797604	18.42537612
PUE22040216885 4	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Yovalastoc	CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOVALASTOC, 75949 YOVALASTOC, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO, CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC LAS LUMINARIAS SE COLOCARON EN	-96.86583521	18.25660519
PUE22040217668 2	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Mazatzongo de Guerrero	CAMINO TRAMO ENTRONQUE MAZATZONGO - CENTRO DE MAZATZONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MAZATZONGO DE GUERRERO, 75947 MAZATZONGO DE GUERRERO, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO A ZACATEPEC Y CAMINO AL CENT	-96.83872148	18.27999861

OPERADO

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
PUE22040217659 7	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tepozapa	CAMINO TRAMO TEPOZAPA - PUERTA DEL CIELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 340 PUEBLO TEPOZAPA, 75947	-96.84531899	18.26881599
PUE22040217661 6	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlaxitla	CAMINO TRAMO ENTRONQUE TLAXITLA MIRADOR - TLAXITLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TLAXITLA, 75944	-96.81355716	18.41319162
PUE22040217487 4	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Playa Nueva	CAMINO TRAMO PLAYA NUEVA - TENZIANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 656 PUEBLO PLAYA NUEVA, 75940 PLAYA NUEVA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A TENZIANTLA Y CAMINO CAMINO A PLAYA, LA OBRA SE UBICA EN LA	-96.82769005	18.49516255


104 PLZBPA  
 10-Playa Nueva  
 10-Playa Nueva

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
PUE22040217755 7	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlacotepec de Díaz	CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, 75940 TLACOTEPEC DE DÍAZ, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DIAS ORDAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIN	-96.85044885	18.40500525
PUE22040217751 7	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Tlaxitla	CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACXITLA, 75944 TLACXITLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA EN ELCENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LAIN	-96.80354253	18.40968275

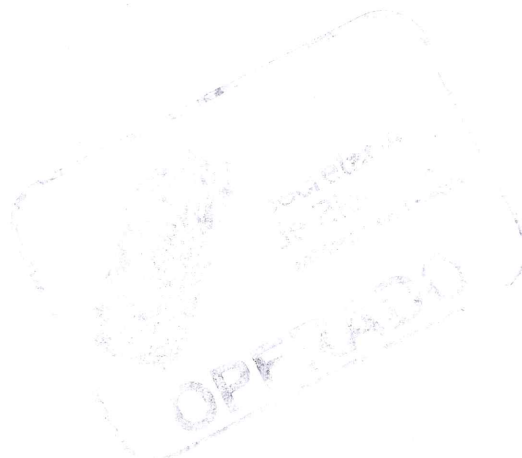

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	DI UNIDAD DE M	META	ORIGIN	META	MODIFI	AVANCE	PORCENTAJE
PUE22040218	2022		4	Metros lineal	1839.2		1839.2	1839.2	100
PUE22040216	2022		4	Piezas	10		10	10	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	6600		6600	6600	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	20040		20040	20040	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	18600		18600	18600	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	18280		18280	18280	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	840		840	840	100
PUE22040217	2022		4	Metros Cuadr	576		576	576	100

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
			A	E		
PUE2204021 80964	Obra	MSSTP-AD- 39/22	JOAQUÍN ATLAHUA HERNÁNDEZ	San Sebastián Tlacotepec	670550.39	670550.39
PUE2204021 68854	Obra	MSSTP-AD- 36/22	JOSUE TRINIDAD TENAHUA	San Sebastián Tlacotepec	391800.44	391800.44
PUE2204021 76682	Obra	MSSTP-IR3- 43/22	JAIR ALEXIS AVENDAÑO BELLO	San Sebastián Tlacotepec	1335743.11	1335743.11
PUE2204021 76597	Obra	MSSTP-IR5- 41/22	JOSE SANCHEZ LOPEZ	San Sebastián Tlacotepec	1895183.22	1895183.22
PUE2204021 76616	Obra	MSSTP-IR5- 42/22	JOSUE TRINIDAD TENAHUA	San Sebastián Tlacotepec	1695618.92	1695618.92
PUE2204021 74874	Obra	MSSTP-IR5- 40/22	JAIR ALEXIS AVENDAÑO BELLO	San Sebastián Tlacotepec	2670124.81	2670124.81
PUE2204021 77557	Obra	MSSTP-LP- 38/22	JAIR ALEXIS AVENDAÑO BELLO	San Sebastián Tlacotepec	3992139.48	3992139.48
PUE2204021 77517	Obra	MSSTP-IR5- 37/22	JOSE SANCHEZ LOPEZ	San Sebastián Tlacotepec	1579114.77	1676420.5






FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
PUE22040217755 7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		300000	300000
PUE22040217755 7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3992139.48	3992139.48
PUE22040217751 7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN		500000	500000
PUE22040217751 7	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1676420.5	1676420.5



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
PUE220402177557	Metros Cuadrados	840	840
PUE220402177517	Metros Cuadrados	576	576




FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
PUE22040217755 7	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Díaz	CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, 75940 TLACOTEPEC DE DÍAZ, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DIAS ORDAZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIN	-96.85044885	18.40500525
PUE22040217751 7	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlaxitla	CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACXITLA, 75944 TLACXITLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD DE TLACXITLA EN ELCENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LAIN	-96.80354253	18.40968275

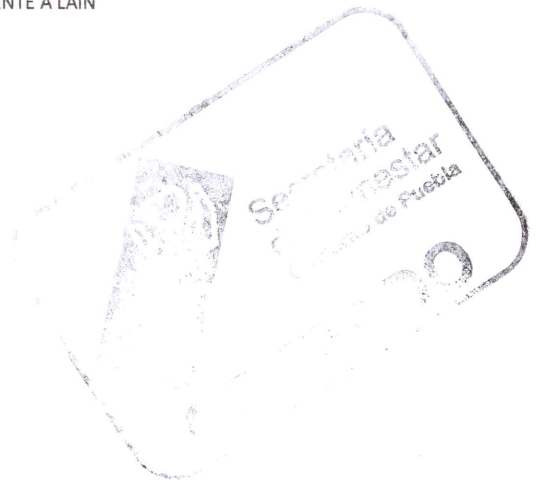

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
-------	--------------	--------	-------------	------------	-------	------------------

PUE220402177557	Obra	MSSTP-LP-38/22	JAIR ALEXIS AVENDAÑO BELLO	San Sebastián Tlacotepec	3992139.48	3992139.48
-----------------	------	----------------	----------------------------	--------------------------	------------	------------

PUE220402177517	Obra	MSSTP-IR5-37/22	JOSE SANCHEZ LOPEZ	San Sebastián Tlacotepec	1579114.77	1676420.5
-----------------	------	-----------------	--------------------	--------------------------	------------	-----------

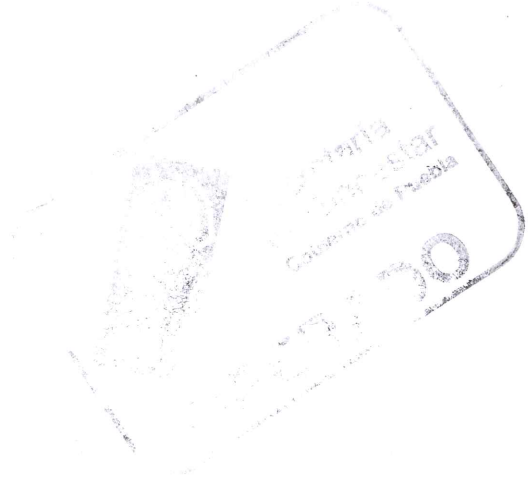

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	DIUNIDAD DE M	META	ORIGIN	META	MODIFI	AVANCE	PORCENTAJE
PUE220402177557	2022		4 Metros Cuadr		840		840	840	100
PUE220402177517	2022		4 Metros Cuadr		576		576	576	100









**C.C. PRESIDENTES Y PRESIDENTAS  
MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA  
PRESENTES**

Con fundamento en los artículos 1 segundo y cuarto párrafo, 3 segundo párrafo, 4, 5, 6, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, II y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracción IV y 25 fracciones VIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; numerales Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto, de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo General 33 (SRFT), me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al Informe de Cuarto Trimestre del ejercicio 2022. Señalando que en aquellos casos en los que el estatus corresponda a **NO REPORTÓ (rojo)** o **NO SOLVENTÓ (amarillo)**, deberán llevar a cabo las medidas necesarias para el cumplimiento del reporte de información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el próximo trimestre, y solventar dichas observaciones, evitando que las instancias correspondientes lleven a cabo el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades que correspondan por las omisiones a la Ley.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de enero de 2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

Cc p. Lizeth Sánchez García. - Secretaría de Bienestar. - Para su conocimiento. - Presente.

Archivo


CSLA/ab/mshs






Resultados SRFT  
Trimestre 2022  
M


Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores




Resultados SRFT  
Trimestre 2022  
RTAMUN


Módulo Destino del Gasto






Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



us  Si Reporto  No Solvento  No Reporto



Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación

INDICE (FAIS2022.pkg\_faiss.fs) | MONITOR FISMDF (FAIS2022.pkg\_monitor\_fismdf.fs?pi\_entidad\_federativa=21&pi\_municipio=0) | INFORMACION FISMDF (FAIS2022.pkg\_informacion\_fismdf.fs?pi\_entidad\_federativa=21&pi\_municipio=21145)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" [aquí \(https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022\)](https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2022)

Proyectos del Municipio de SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC del Estado de PUEBLA

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto	Informado a la UED	Participación Social	Cédulas de Verificación	Consultar Solicitudes	Acreditación de Pobreza Extrema	Editar Eliminar	Estatus de Firma	Revisión	Observaciones por Solventar	Avis
1	21153	\$ 1,750,322.54	Zap.Loc.2Grs.P.Ext.Direc	Compl	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/3	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE MORELOS Y TANQUE DE AGUA DEL BARRIO GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA REHABILITACIÓN DE CAMINO BUENA VISTA BARRIO LA RAYA DEL KM CERO AL KM CERO MAS QUINIENTOS VEINTE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA,														
2	25999	\$ 700,627.89		✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-	-	-
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ,														
3	27798	\$ 1,963,830.12		✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/5	-	-	-
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA,														
4	28270	\$ 785,193.79		✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/5	-	-	-
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO														
5	28882	\$ 2,356,690.10		✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/4	-	-	-
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA. AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE														
6	29093	\$ 1,570,540.70		✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/5	-	-	-
CUAUHEMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.														

srf to bienestar @ puebla.gob.mx

7	85917	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EN EL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA	\$ 2,675,728.04	-	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
8	86015	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO AL ENTRONQUE DE TEPOZAPA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 2,674,889.14	✓	-	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
9	86118	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E BUENA VISTA DE CUAUHTEMOC A PARAJE TECUANAPA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS DOSCIENTOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTEMOC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 2,654,258.26	-	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
10	86397	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIOLA A LA LOCALIDAD DE OVATERO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 2,629,641.65	✓	-	-	-	✓	✓	0/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
11	86699	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIZIANTLA ENTRE TECHADO DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 1,027,534.12	-	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
12	86846	REHABILITACION DE CAMINO DE LOMAS DE GUADALUPE A LAS PALMAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 2,338,847.68	-	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
13	166131	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 439,398.52	-	✓	-	✓	-	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
14	166580	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CATALIHUIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 878,597.14	-	✓	-	✓	-	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-

15	166785	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CARPINTERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA	\$ 1,574,276.19	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
16	166873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS DOCIENTOS NOVETA Y OCHO PUNTO DOCE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 980,008.38	✓	-	-	✓	✓	0/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
17	166964	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA AMALIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 646,478.76	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
18	167500	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE CLÍNICA DE LA LOCALIDAD Y PREESCOLAR PRIMAVERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 1,128,424.09	✓	-	-	✓	✓	0/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
19	167575	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	\$ 535,780.10	✓	-	-	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
20	174456	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 1,318,904.98	✓	-	✓	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
21	174628	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 1,669,499.72	✓	-	✓	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
22	174849	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA.	\$ 1,142,031.22	✓	-	✓	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
23	175073	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA	\$ 1,186,330.28	✓	-	✓	✓	✓	3/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
24	176047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN	\$ 2,198,557.55	✓	-	✓	✓	✓	0/4	0/3			No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-

25	177186	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 417,341.45	✓	✓	✓	3/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/4
26	177319	TLACOTEPEC PUEBLA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 2,516,390.17	✓	✓	✓	3/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/4
27	177483	TLACOTEPEC PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COYOMEATL. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 1,665,267.92	✓	✓	✓	3/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/4
28	179088	TLACOTEPEC, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COTZOCUABTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 1,921,627.66	✓	✓	✓	3/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
29	179739	TLACOTEPEC, PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL BARRIO ROJAS DE LA LOCALIDAD DE CACATILIHUIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 319,769.44	✓	✓	✓	3/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2
30	179939	TLACOTEPEC PUEBLA CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL PEÑAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO AL PANTEÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 966,138.54	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2
31	180507	TLACOTEPEC PUEBLA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 871,548.17	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	Firmado-REVISADO	0/4
32	288074	TLACOTEPEC PUEBLA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YOVALASTOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 391,800.44	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	Firmado-	
33	316910	TLACOTEPEC, PUEBLA, REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 2,670,124.81	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	Firmado-	
34	324714	TLACOTEPEC, PUEBLA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE PARAJE PUERTA DEL CIELO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRECIENTOS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	\$ 1,895,183.22	✓	✓	✓	0/4	0/3		No Aplica	Firmado-	

2022-5/4

D

2022-46

C

2022-47

C

ofate

ofate

X	35 324782	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	2022-48	\$ 1,695,618.92	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	Firmado- PUE 2204021766416			
	X	36 325090	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	2022-49	\$ 1,335,743.11	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	Firmado- PUE 220402176682 2 fonda		
		X	37 328397	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	2022-43	\$ 1,676,420.50	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	Firmado- PUE 220402177817 1,579,114.77 2,176,420.50 2 fonda firm y fertumun (300,000) 2 fonda	
			X	38 328506	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	2022-44	\$ 3,992,139.48	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica	Firmado- PUE 220402177857 4,292,139.48 2 fonda FCM y fertumun (300,000)
				X	39 339475	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA.	2022-45	\$ 670,550.39	✓	✓	0/4	0/3	No Aplica

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

2 fcm  
349,244.35  
32,313  
F

D 2  
C 6  
41:17 - 41:16  
Normat.

9,769,502

Percepción  
61046,423

10y 61,046,423  
Inter 336,975.53  
10y 61,383,398.53  
Total 32,313

Demanda  
61,383,354.38

349,244.35  
41,837.92 6,668.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RWZ  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asij/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Fisico
5.02	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DE)						
3.3.1.2	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						
202226	PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC DEL EJERCICIO 2022 COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,214,368.02	0.00	1,214,368.02	100.00 100.00
6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL						
202218	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	AGUA AZUL SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	439,398.52	0.00	439,398.52	100.00 100.00
202219	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATILIHUIC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	878,597.14	0.00	878,597.14	100.00 100.00
202220	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	NARANJASTITLA DE VICTORIA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,318,904.98	0.00	1,318,904.98	100.00 100.00
202222	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	EL MIRADOR SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,669,499.72	0.00	1,669,499.72	100.00 100.00
202223	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	LAS PALMAS SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,142,031.22	0.00	1,142,031.22	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RWZ  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
202224	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,186,330.28	0.00	1,186,330.28	100.00 100.00
202225	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	POR CONTRATO	2,188,557.55	0.00	2,188,557.55	100.00 100.00
202230	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	OCOTZOCUABILLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,921,627.66	0.00	1,921,627.66	100.00 100.00
202231	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CRUZTITLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,516,390.17	0.00	2,516,390.17	100.00 100.00
202232	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TEPEXILOTLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	871,548.17	0.00	871,548.17	100.00 100.00
202233	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NAKANJASTITLA DE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	NAKANJASTITLA DE VICTORIA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	417,341.45	0.00	417,341.45	100.00 100.00
202234	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COYOMEATL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	COYOMEATL SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,665,267.92	0.00	1,665,267.92	100.00 100.00



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
202235	OR EN LA LOCALIDAD DE COYOMEATL, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE MUROS FIRME EN EL	ZACATILHUIC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	319,769.44	0.00	319,769.44	100.00 100.00
6.1.2.1	EDIFICACION NO HABITACIONAL			16,545,264.22			
202243	BARRIO HOJAS EN LA LOCALIDAD DE ZACATILHUIC, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TLACXITLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,676,420.50	1,676,420.50	1,676,420.50	100.00 100.00
202244	S Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC ESTIMACION 01 FINIQUITO OBRA 202243	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	3,992,139.48	3,992,139.48	3,992,139.48	100.00 100.00
6.1.3.1	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			5,668,559.98			
202245	MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 05 DIC ESTIMACION 01 OBRA 202244 29 DIC ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA 202244	VILLA DEL RIO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	670,550.39	670,550.39	670,550.39	100.00 100.00
6.1.4.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			1,750,322.54			
202201	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,750,322.54	0.00	1,750,322.54	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
202203	HIDRAULICO DE LA CALLE LAS AMERICAS ENTR CALLE MORELOS Y TANQUE DE AGUA DEL BARRI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBAST COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TLACOTEPEC PUEBLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,963,830.12	0.00	1,963,830.12	100.00 100.00
202204	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAYATZONGO DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	MAZATZONGO DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,356,690.10	0.00	2,356,690.10	100.00 100.00
202205	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAHUTEMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	BUENA VISTA DE CUAHUTEMOC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,570,540.79	0.00	1,570,540.79	100.00 100.00
202207	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUANUCHEA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CUANUCHEA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	785,193.79	0.00	785,193.79	100.00 100.00
202213	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO LOCALIDAD DE CUANUCHEA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TENTZANTLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,027,534.12	0.00	1,027,534.12	100.00 100.00
202238	HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZANTLA ENTRE TECHADO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL PEÑAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN MAZATEOPAN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	966,138.54	0.00	966,138.54	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, CCG y Obra	Detalle de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
202241	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YOVALASTOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	YOVALASTOC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	391,800.44	0.00	391,800.44	100.00
6.1.5.1.	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES			10,812,050.35			
202202	REHABILITACION DE CAMINO BUENA VISTA - BARRIO LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	BUENA VISTA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	700,627.69	0.00	700,627.69	100.00
202208	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+436.90 POR EL LADO COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	TECOLOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,675,728.04	0.00	2,675,728.04	100.00
202210	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E" DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO AL ENTRONQUE DE TEPOZAPA DEL KM 0+000.00 AL COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATEPEC DE BRAVO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,674,889.14	0.00	2,674,889.14	100.00
202211	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E" BUENA VISTA DE CUATEMOC A PARAJE TECUANAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 2+200.00 EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	BUENA VISTA DE CUATEMOC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,654,258.26	0.00	2,654,258.26	100.00
202214	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PILOLA A LA LOCALIDAD DE OXATERO, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+400.00, PERTENEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	PILOLA-OXATERO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,629,641.65	0.00	2,629,641.65	100.00
202215	REHABILITACION DE CAMINO DE LOMAS DE BUENA VISTA, PERTENEC COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	LOMAS DE BUENA VISTA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,338,847.68	0.00	2,338,847.68	100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Fisico
202216	GUADALUPE A LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL KM 2+500.00 EN LA LOCALIDAD DE IOMAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	CARPINTERO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,574,276.19	0.00	1,574,276.19	100.00 100.00
202217	HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CARPINTERO, PERTENECIENTE A COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	OCOTZOCUABTLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	535,780.10	0.00	535,780.10	100.00 100.00
202221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM 0+000 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	VISTA HERMOSA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	980,008.38	0.00	980,008.38	100.00 100.00
202235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA AMALIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	VILLA DEL RIO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	646,478.76	0.00	646,478.76	100.00 100.00
202237	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN MAZATEOPAN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,128,424.09	0.00	1,128,424.09	100.00 100.00
202246	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL KM 3+656.09 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE A COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 02 DIC ESTIMACION 01 OBRA 202246	PLAYA NUEVA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	2,987,056.19	2,987,056.19	2,987,056.19	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RWZ  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
202247	13 DIC ESTIMACION 02 OBRA 202246 29 DIC ESTIMACION 03 FINIQUITO OBRA 202246 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE PARAJE PUERTA DEL CIELO DEL KM 0+000. 00 AL KM 3+340.00 EN LA LOCALIDAD DE TEP COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 02 DIC ESTIMACION 01 OBRA 202247 15 DIC ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA 202247	TEZOZAPALA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,895,183.22	1,895,183.22	1,895,183.22	100.00
202248	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL KM 3+100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENCIENTE AL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 02 DIC ESTIMACION 01 OBRA 202248 15 DIC ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA 202248	TLACXITLA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,695,618.92	1,695,618.92	1,695,618.92	100.00
202249	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000.00 AL KM 1+100.00 EN LA LOCALIDAD DE NAZATZONGO DE GUERRERO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC ESTIMACION 01 FINIQUITO OBRA 202249	NAZATZONGO DE GUERRERO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,335,743.11	1,335,743.11	1,335,743.11	100.00
5.0.3	SUBTOTAL (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF).....			61,363,354.38	14,252,711.81	61,363,354.38	
1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA						
202248	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO 2022 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 15 DIC PASO DE IRA, 2DA DE DICIEMBRE Y AGUINALD	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	ADMON. DIRECTA	314,900.00	74,600.00	314,900.00	100.00
1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						

28,452,561.47

(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
202228	PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EJERCICIO 2022 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 15 DIC PAGO DE IRA, 2DA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	ADMIN. DIRECTA	74,600.00 389,500	74,600.00	74,600.00	100.00 100.00
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES						
202240	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	119,590.20	119,590.20	119,590.20	100.00 100.00
2.8.2.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
202242	ADQUISICION DE ARGUMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	CONVENIO	11,886.00	0.00	11,886.00	100.00 100.00
3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						
202206	PAGO A C.F.F. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EJERCICIO 2022 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 05 DIC PAGO A C.F.F. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE AGOSTO 2022 06 DIC PAGO A C.F.F. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 10 DIC PAGO A C.F.F. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	ADMIN. DIRECTA	787,648.00	312,752.00	787,648.00	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RWZ  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COS y Obra	Nombre de la obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
5.1.5.1 202227	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b> ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	FOR CONTRATO	217,384.00	0.00	217,384.00	100.00 100.00
5.4.1.1 202251	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS</b> ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	FOR CONTRATO	688,924.00	688,924.00	688,924.00	100.00 100.00
5.5.1.1 202242	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b> ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	CONVENIO	285,398.06	0.00	285,398.06	100.00 100.00
6.1.2.1 202229	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b> CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE SALON DE USOS DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	LA CUMBRE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	FOR CONTRATO	1,183,871.79	0.00	1,183,871.79	100.00 100.00
202239	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATEPEC DE BRAVO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	FOR CONTRATO	1,733,769.09	0.00	1,733,769.09	100.00 100.00
202243	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIFUNCIONALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	TLACOTEPEC SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	FOR CONTRATO	346,187.69	346,187.69	346,187.69	100.00 100.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
202214	S Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACMITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC ESTIMACION 01 FINIQUITO OBRA 202243	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	420,002.06	420,002.06	420,002.06	100.00
				3,685,820.63			
6.1.5.1	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES						
202237	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN MARTIN MAZATEOPAN SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	262,403.38	0.00	262,403.38	100.00
202246	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000.00 AL KM 3+556.09 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE A COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 02 DIC ESTIMACION 01 OBRA 202246 13 DIC ESTIMACION 02 OBRA 202246 29 DIC ESTIMACION 03 FINIQUITO OBRA 202246	PLAYA NUEVA SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	794,266.57	794,266.57	794,266.57	100.00
6.1.9.1	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS						
202209	CONSTRUCCION DE EXPLANADA SOCIOCULTURAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DE BRAVO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATEPEC DE BRAVO SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	POR CONTRATO	1,626,527.50	0.00	1,626,527.50	100.00
202250	MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVA	TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	ADMN. DIRECTA	539,346.73	539,346.73	539,346.73	100.00



MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA  
 RFC: MSS850101RW2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2022

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
	DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DIF) MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLACO						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	22 DIC ESTIMACION O1 FINIQUITO OBRA 202250						
	SUBTOTAL (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			9,406,705.07	3,370,279.25	9,406,705.07	
	TOTAL			70,770,059.45	17,622,991.06	70,770,059.45	

2,165,894.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RAYMUNDO ATAMACIO ARCIGA FRANCISCO CISNEROS SOLANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO MUNICIPAL

EMANUEL PORANTES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL
